


VINDMØLLER OG STØRRE SOLCELLEANLÆG I AABENRAA KOMMUNE

status den 21. april 2026

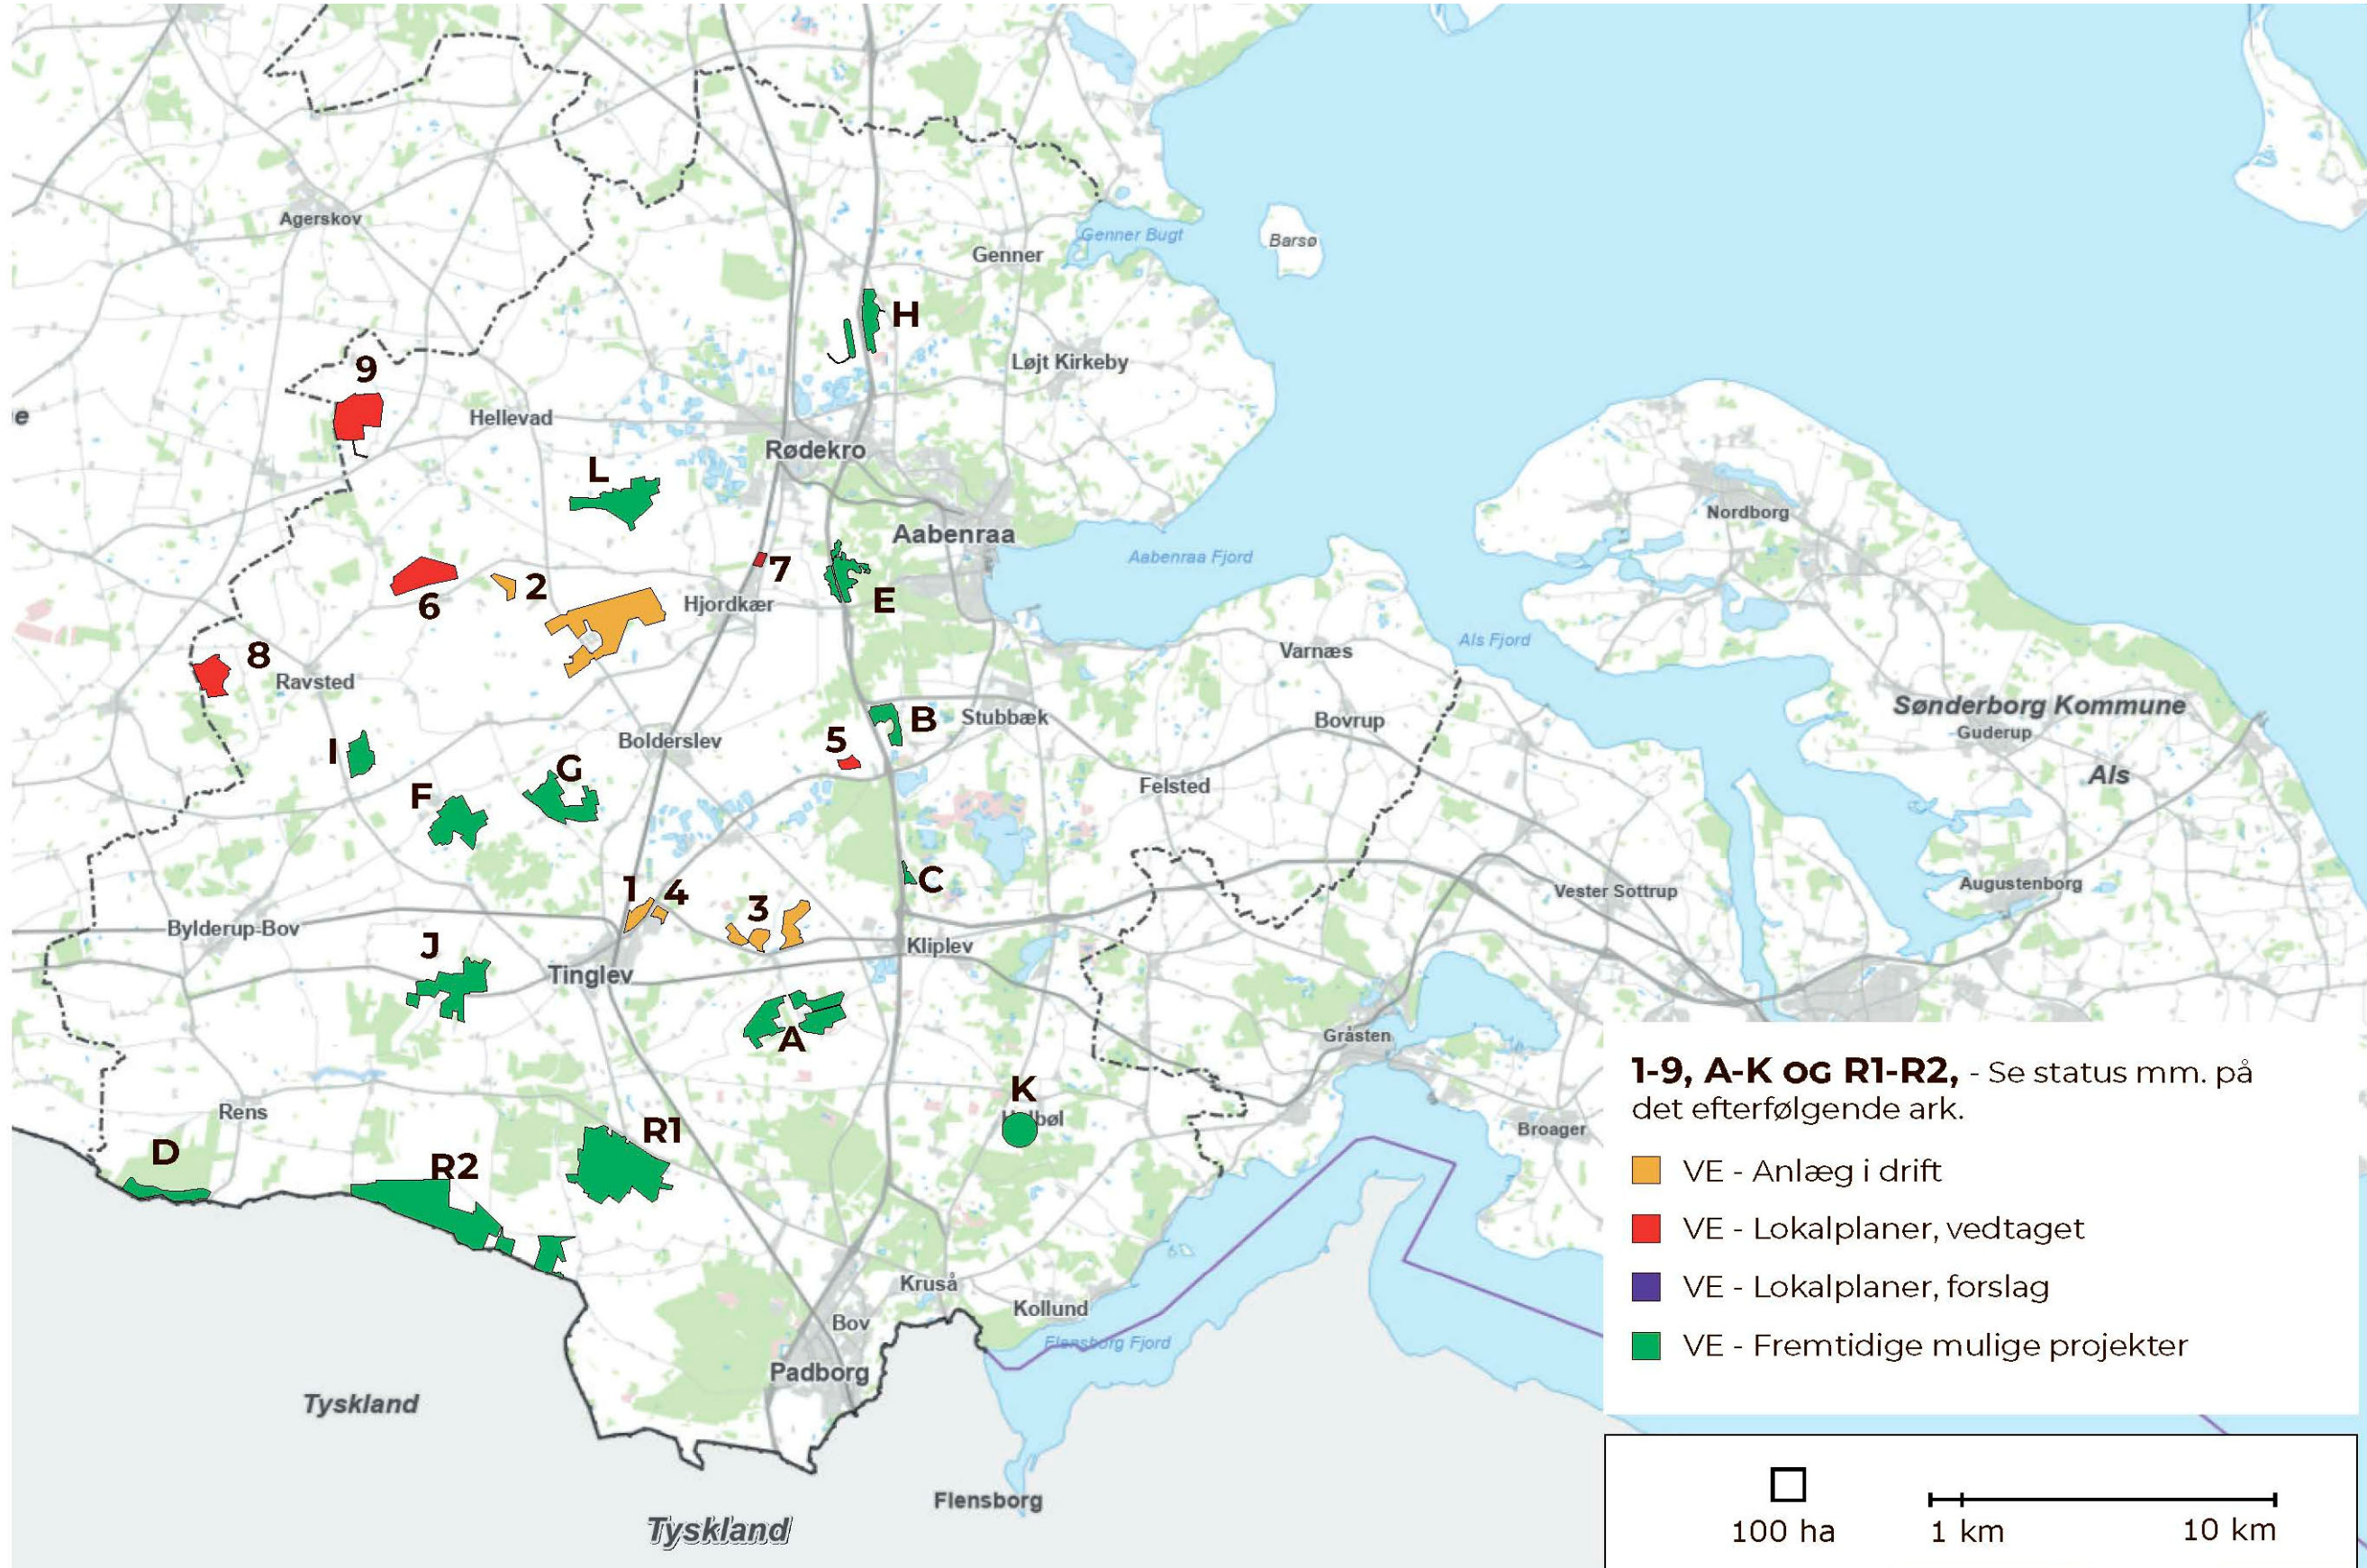

VINDMØLLER OG STØRRE SOLCELLEANLÆG I AABENRAA KOMMUNE, STATUS den 21. april 2026

EKSISTERENDE, PLANLAGTE OG UNDER PLANLÆGNING*

* Kursiverede tal er oplyst af ansøgerne eller anslåede

Nr.	Art	Titel	Ansøger/opstiller	Brutto ha/møller	MWh/år	Grøn pulje, mio. kr.	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters prioritering af projekterne A-K	Status
Vindmøller af ældre dato (fremgår ikke af kortet)				109, heraf 80 store	200.000	-	Indgår ikke	Eksisterende
1	Solcelleanlæg	Gl. anlæg nord for Tinglev		42/0	25.000	-	Indgår ikke	Eksisterende
2	Solcelleanlæg	Ved Hjølderup	European Energy	334/0	330.000	9,508	Indgår ikke	Eksisterende
3	Solcelleanlæg	Ved Bjerndrup	Better Energy	93/0	87.000	2,248	Indgår ikke	Eksisterende
4	Solcelleanlæg	Nyt anlæg nord for Tinglev	Amplio Denmark ApS	17/0	8.000	0,58	Indgår ikke	Eksisterende
5	Solcelleanlæg	Nordvest for Torp	Loff Energi ApS	36/0	34.000	1,1	Indgår ikke	Endeligt vedtaget i byrådet 22. februar 2023. Byggetilladelse givet. Byggeriet er igangsat. Bygherre har søgt om dispensation fra lokalplanen og landzonetilladelse til etablering af et batterianlæg i området ved transformatorstationen. Plan- og Boligudvalget har den 12. januar 2026 besluttet at afgørelse på en miljøscreening skal sendes i myndighedshøring (er gennemført), og der skal foretages en naboorientering ifm med landzonesagen (planlægges udsendt i uge 18/2026).
6	Solcelleanlæg	Nord for Fogderup	Amplio Denmark ApS	118/0	72.500	2,3	Indgår ikke	Endeligt vedtaget i byrådet 21. december 2022. Byggetilladelse givet. Byggeriet er igangsat. Der er ansøgt om tilladelse til BESS-anlæg indenfor plan- og projektområdet. Ansøgningen er i proces i forvaltningen.
7	Solcelleanlæg	SM Industries A/S	SM Industries A/S	10/0	7.000	0,2	Indgår ikke	Endeligt vedtaget i byrådet 28. april 2023. Der er ikke søgt om byggetilladelse.
8	Solcelleanlæg	Vest for Ravsted	European Energy	81/0	60.000	4,8	Indgår ikke	Endeligt vedtaget i byrådet den 26. november 2025, der er ikke søgt om byggetilladelse.

9	Solcelleanlæg	Ved Svejlund	European Energy	140/0	105.000	7,3	Indgår ikke	Endeligt vedtaget i byrådet den 26. november 2025, der er ikke om søgt byggetilladelse. Forvaltningen har modtaget en ansøgning om et BESS-anlæg indenfor plan- og projektområdet. Der pågår dialog om ansøgningen.
A	Solcelleanlæg	Ved Perbøl	Green Partners Holding A/S	190/0	190.000	19,6	Nr. 2	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 28. november 2024 at igangsætte en forhøring. Borgermøde den 20. januar. Høring indtil 5. februar 2025. Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og forelægges Plan- og Boligudvalget, der beslutter om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan. Ansøgningen/projektet er overtaget af Green Partners fra Better Energy. Green Partners har meddelt kommunen, at sagen er sat på pause. Green Partners har meddelt, at man forventer planprocessen genoptaget efter sommerferien 2026.
B	Solcelleanlæg	Ved Røllum	SolEnergi Røllum	57/0	50.000	5,4	Nr. 5	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 24. september 2024 at igangsætte en forhøring. Der var borgermøde den 29. oktober. Høringen varede indtil 4. december 2024. Resultatet af høringen behandles i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 10. juni 2025, hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med sagen og udarbejdes udkast til planforslag, miljøvurdering og § 25 tilladelse. Forvaltningen er i dialog med ansøgeren om dette.
C	Solcelleanlæg	Ved Potterhusvej	LandSyd på vegne af ejer	18/0	19.100	1,9	Nr. 4	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger er modtaget i forvaltningen 6. november 2024. Forvaltning er i dialog med ansøgeren om udkast til høringsmaterialer. Opdaterede dokumenter til forhøringsmaterialet er modtaget den 4. februar 2026.
D	Solcelleanlæg	Syd for Rens Hedegård Plantage	Green Elephant ApS	79/0	57.000	4,6	Nr. 3	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget i forvaltningen 2. september 2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. januar 2025 udvidet med et BESS-anlæg (større batteri). Forvaltning er i dialog med ansøgeren om udkast til høringsmaterialer. I februar 2026 har ansøgeren reduceres projektarealet med 31 hektar.
E	Solcelleanlæg	Aabenraa Vest	GreenGo Energy A/S og Green Elephant ApS	137/0	87.000	6,6	Nr. 9	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede 29. august 2024, at der arbejdes videre med sagen, idet der indledes med en Natura 2000 væsentlighedsvurdering. Udkast til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering er modtaget den 6. november 2024. Forvaltningen er i dialog med ansøgeren om udkast til væsentlighedsvurderingen. Endvidere drøftes en alternativ plan, hvor et mindre areal planlægges for et solcelleanlæg.
F	Solcelleanlæg	Syd for Smedager	Green Elephant ApS	150/0	107.000	8,1	Nr. 7	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget i forvaltningen 2. september 2024. Udkast til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering er modtaget den 9. december 2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. januar 2025 udvidet med et BESS-anlæg (større batteri). Forvaltningen har aftalt med ansøgeren, at "Rens-sagen" først forberedes og benyttes som skabelon.

G	Solcelleanlæg	Ved Gåskær	Amplio Denmark ApS	164/0	180.000	18,1	Nr. 10	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede 29. august 2024, at der ønskes særskilt fokus på kontakten, der har været med de nærmeste naboer førend, der tages stilling til videre planlægning. Forvaltningen afventer en redegørelse om dette og udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger. Adspurgt, har ansøgeren i februar 2026 meddelt, at man fortsat er interesseret i at gennemføre projektet.
H	Hybridanlæg	Sønderjyske Motorvej	NRGi	99/0	50.800	4,1	Nr. 1	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 14. januar 2025 at igangsætte en forhøring hvor der indkaldes ideer og forslag mv. til planlægningen og til afgrænsning af miljøvurderingen. Høringen fandt sted i perioden 22. januar til 19. marts 2025. Resultatet af høringen behandles i forvaltningen og forelægges Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, der beslutter om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan. Ansøgeren forsøger at få en aftale med Forsvarsministeriet, der har varslet et veto mod vindmøllerne. Adspurgt, har ansøgeren i februar 2026 meddelt, at man fortsat er interesseret i at gennemføre projektet.
H	Hybridanlæg	Sønderjyske Motorvej, 8 x 4,2 MW (150 m)	NRGi	0/8	100.000	10,5		
I	Solcelleanlæg	Ved Bredevad	Unison Energy Partners ApS	62/0	42.000	5,5	Nr. 6	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 24. september 2024 at igangsætte en forhøring. Der var borgermøde den 7. november. Høringen varede indtil 4. december 2024. Resultatet af høringen blev behandlet i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 6. marts og den 8. maj 2025. Det besluttedes at arbejde videre med sagen, idet der skal der foretages humusundersøgelser i et område mod syd, inden det afgøres om dette område skal udtages. Ansøgeren har efterfølgende meddelt at området udtages af projektet, hvorfor der ikke foretages humusundersøgelser. Forvaltningen er i dialog med ansøgeren om udarbejdelse af udkast til planforslag, miljøvurdering og § 25-tilladelse.
J	Solcelleanlæg	Ved Frestrup	GreenGo Energy A/S	173/0	136.000	10,4	Nr. 8	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har den 6. juni 2024 besluttet at der indledes planlægning. Udkast til forhøringsdokumenter fra ansøger modtaget 2. september 2024. Ansøgningen/projektbeskrivelsen er den 28. februar 2025 udvidet med et BESS-anlæg (større batteri). Forespurgt, har ansøgeren i februar 2026 meddelt, at man fortsat er interesseret i at gennemføre projektet. Der pågår nu dialog om forhøringsmaterialet mellem ansøgeren og forvaltningen.
K	Vindmølle	Ved Holbøl	Holbøl Lokalråd m.fl.	0/1	-		Afventer	Lokalrådet arbejder på organisering og finansiering af det lokale fjernvarmeprojekt. Projektet overvejes udvidet til at omfatte Kollund.
RI	Solcelleanlæg	Øst for Eggebæk Plantage	European Energy	409/0	400.000	44	Indgår ikke	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. oktober at igangsætte forhøring. Hørigsperiode 23. oktober til 18. december 2024. Borgermøde 11. november. Resultatet af høringen behandlede i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 13. august 2025, hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med sagen og udarbejdes udkast til planforslag, miljøvurdering og § 25 tilladelse. Forvaltningen er i dialog med ansøgeren om dette.
RII	Hybridanlæg	Bølåvej - solceller	European Energy	451/0	400.000	44	Indgår ikke	Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. oktober at igangsætte forhøring. Hørigsperiode 23. oktober til 18. december 2024. Borgermøde 11. november. Samtidig høring af tyske myndigheder og borgere. Resultatet af høringen behandlede i Udvalget for

RII	Hybridanlæg	Bølåvej - vindmøller, 8*4,5 MW (150 m)	European Energy	0/8	96.000	11,3	Indgår ikke	Plan, Teknik og Landdistrikter den 2. september 2025, hvor udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med sagen og udarbejdes udkast til planforslag, miljøvurdering og § 25 tilladelse. Forvaltningen er i dialog med ansøgeren om dette.
L	Hybridanlæg	Nørre Ønlev, solceller	Wind Estate	182,5/0	137.000	9,5	Indgår ikke	Plan- og Boligudvalget besluttede den 2. mart 2026 at der kan igangsættes en indledende planlægning for projektet. Forvaltningen afventer en opdateret ansøgning/projektbeskrivelse, som kan lægges til grund for et første møde.
L	Hybridanlæg	Nørre Ønlev, Vindmøller	Wind Estate	0/14	168.000	20		
